



PMP新模拟三高频错题

主讲老师：郭晗老师

现代卓越
专注项目管理培训26年



模拟三-第3题

错误多为C

3.某项目团队在参加一个项目招标，但**该团队没有进行过类似项目的招标，同时项目团队成员没有参加过此类项目的经历**，项目经理应该如何评估项目经费？

- A. 类比估算
- B. 参数估算
- C. 三点估算
- D. 自下而上估算

解析：自下而上估算

“如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算具体的持续时间，接着再汇总这些资源需求估算，得到每个活动的持续时间。”



模拟三-第4题

错误多为AD

4. 一个客户请求将一项新功能添加到项目中。一项市场调查已完成，并显示**此功能将为项目带来市场价值**。请问项目经理接下来应该做什么？

- A. 开展最小可行性产品（MVP）分析。
- B. 确认新功能位于迭代待办事项列表。
- C. 确认新功能位于产品待办事项列表。
- D. 与项目团队成员开展技术审查。



模拟三-第7题

错误多为B

7. 在项目执行期间，**项目发起人要求加入一个高优先级的需求**，声称只需占用很少的工作量。项目经理清楚，**团队尚有余力**。项目经理应该怎么处理？

- A. 把任务交给团队处理。
- B. 让团队针对高优先级的任务评估人力耗费情况。
- C. 把加入待办列表的权力交给项目经理。
- D. 提交变更请求。



模拟三-第8题

错误多为AB

8.一个重大项目刚成立，项目经理上任后，在准备沟通管理计划，在选择**沟通技术**时需要考虑以下哪个选项（选择两个）？

- A. 确保干系人在选择沟通技术时有发言权。
- B. 确保沟通技术得到发起人的审批。
- C. 确保使用最新的沟通技术。
- D. 所有干系人都能使用的沟通技术。
- E. 在选择沟通技术时考虑信息的保密性。

解析：

“可能影响沟通技术选择的因素包括：

- 易用性。沟通技术的选择应适合项目参与者，而且应在合适的时候安排适当的培训活动。
- 信息需求的紧迫性。信息传递的紧迫性、频率和形式可能因项目而异，也可能因项目阶段而异。
- 项目环境。团队会议与工作是对面还是在虚拟环境中开展，成员处于一个还是多个时区，他们是否使用多种沟通，是否还有能影响沟通效率的其他环境因素（如与文化有关的各个方面）？
- 技术的可用性与可靠性。用于发布项目沟通工件的技术，应该在整个项目期间都具备兼容性和可得性，且**对所有相关方都可用**。
- **信息的敏感性和保密性。**”



模拟三-第10题

错误多为D

10.在迭代规划期间，**低能力团队成员对设计方法提出了质疑，可这个设计方法是由一个有丰富经验的高级团队成员制定，并且项目负责人也有丰富的技术背景。**请问项目负责人应该怎么做？

- A. 提出质疑的低能力团队成员遵循已商定的设计方法。
- B. 进行变更，在两个设计方法之间进行折中。
- C. 跟现在设计方法开发人员开会和讨论，进行进一步解释。
- D. 跟提出质疑的人员开会，让他提供设计方法具体的细节。



模拟三-第16题

错误多为D

16.作为入职的一个环节，项目负责人需要与新团队成员沟通项目情况，**项目负责人应首先与新团队成员讨论哪个项目工件，以确保其了解如何为项目做贡献？**

- A.组织分解结构。
- B.工作分解结构。
- C.商业论证。
- D.项目章程。



模拟三-第17题

错误多为BC

17.项目经理正在管理一个涉及多个分包商的项目。项目过程中，**一家分包商递交了变更请求**，希望扩大其工作范围。项目经理根据对此请求的评审，决定对合同进行修订。这一情景属于以下哪项活动？

- A. 控制采购
- B. 实施采购
- C. 形成合同
- D. 解决争议



模拟三-第21题

错误多为AB

21.项目执行过程中，政府发布了一个影响商业分析的新法规，团队受到影响，因为不知接下来如何开展工作，项目经理应该如何避免这种情况？

- A. 提前给团队进行风险管理的培训
- B. 提前将外部因素纳入风险管理计划
- C. 联系政府官员，把项目有关政策更新给团队成员
- D. 在项目会议上确定不确定性，并纳入风险登记册



模拟三-第23题

错误多为BC

23.一个项目经理领导一个复杂的项目，并且项目处于早期阶段。项目受到有时间因素的限制，因此需要快速提交最可交付成果。项目经理应该怎么管理项目？

- A. 分成好几次发布
- B. 使用看板法管理
- C. 提供持续的价值流和给更好的业务结果
- D. 适应变更持续改进



模拟三-第27题

错误多为D

27.项目经理负责一个敏捷项目。项目很重要，公司领导很重视。公司希望项目经理做好风险管理工作，请问项目经理怎么做？

- A.项目经理作为项目的主要负责人，应该对风险管理工作负责。
- B.项目经理推荐产品负责人落实风险的监控和管理责任。
- C.按照风险管理流程的要求，项目经理做好风险的识别，监控和管理工作。
- D.按照敏捷风险宣言，做好风险识别监控工作。



模拟三-第28题

错误多为AB

28.公司正在进行一个项目，部门经理对项目很感兴趣，但他对项目的影响较小。请问根据权力利益方格理论，项目经理应如何对待这个部门经理？

- A.将项目信息同步给部门经理令其满意。
- B.在项目过程中，允许部门经理参与一些决策权。
- C.将项目相关信息随时告知他。
- D.在一定情况下，满足部门经理的相关要求，包括帮助其升职。



模拟三-第29题

错误多为AD

29.你负责一个跨部门的大型IT项目，项目执行到中期，发现由于技术难题，导致**进度严重滞后，且预算已经超出原计划**。然后你收到了来自高层管理层的指示，要求**项目必须在原定的截止日期前完成，并且不能进一步增加预算**。在这种情况下你怎么做更合适？

- A. 立即召集所有团队成员，进行紧急会议，讨论制定加速项目进度的计划
- B. 与高层管理层沟通，说明当前的技术难题和预算超支情况，请求延长项目时间、增加预算
- C. 评估项目的关键路径，识别并优先解决那些对项目进度影响最大的任务
- D. 暂停非关键任务，集中所有资源解决技术难题，且与供应商协商降低成本



模拟三-第30题

错误多为D

30.一个企业正在用一个新的方法论，一些团队成员感到不适，经过**一段时间部分成员明显产生抗拒情绪**，项目经理应该怎么做来减轻这种趋势？

- A. 授权团队开会自己解决分歧
- B. 项目经理充当中间人发挥影响力，减轻成员对新方法的顾虑
- C. 创建一个开放平等的协作环境
- D. 与成员开展会议讨论新方法的重要性



模拟三-第32题

错误多为ABC

32. 一个项目的团队成员分布在多个时区中，所以项目经理难以及时向团队成员提供最新的信息。在这种情况下，项目经理应该采取什么沟通方法？

- A. 互动沟通
- B. 推式沟通
- C. 公开沟通
- D. 拉式沟通

知识点记忆：

选择互动沟通：当需多方快速对齐或解决争议时（如需求变更讨论）；

选择推式沟通：当需强制同步关键信息（如合规更新）或定期报告时；


选择拉式沟通：当信息量大、团队分散或需支持异步协作时（如跨国文档协作）；

模拟三-第34题

错误多为AD少量B

34. 项目经理所在的项目团队正在进行一个即将完成的项目，项目经理准备为项目成员进行绩效评估，以便评估团队成员是否完成了所分配任务的既定目标，请问项目经理应该在什么时候进行绩效评估？

- A. 绩效评估期结束之前
- B. 绩效评估期开始之后
- C. 项目周期结束之前
- D. 项目完成之后

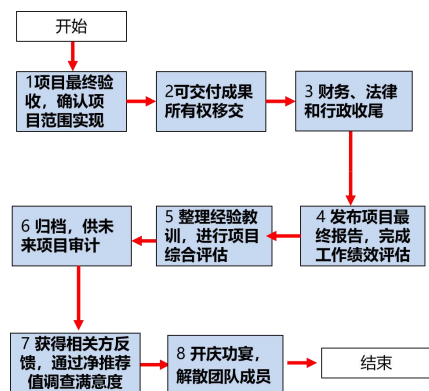



模拟三-第36题

错误多为BD

36. 由于一个新的产品需求，需要项目管理计划**变更**，但文件竟然是缺失的，项目经理要做什么工作来避免再次发生这类事件？

- A. 确认经验教训手册是最新状态
- B. 执行质量过程（QA）流程
- C. 改进配置流程
- D. 将其当做一个问题，进行风险应对



模拟三-第37题

错误多为B

37. 一个旨在提供物理信息系统的项目已经启动，在启动会议上，项目团队意识到一些项目干系人要求2个月内提交设计方案，但是要完成整个项目需要4个月的时间，请问项目经理该与谁沟通，帮助团队加速交付？

- A. 与团队沟通，让团队加快速度满足干系人需求
- B. 产品负责人和干系人——在冲刺代办列表中，对干系人的需求进行优先级排序
- C. 人力资源部门——请求获得更多资源
- D. 干系人——让干系人在产品代办列表中对需求进行排序



模拟三-第40题

错误多为A

40. 公司决定实施新的归档系统项目，**实施过程中发生数据泄露**，项目经理首先应该做什么？

- A. 实施计划的风险响应来处理问题
- B. 与团队一起审查可能的替代文档方法
- C. 使用风险和建议的影响更新风险登记册
- D. 要求团队修复系统以解决问题



模拟三-第41题

错误多为C

41. 一个复杂项目，团队成员绩效下降，团队成员发现遇到的阻碍是**项目成员在多个项目之间多次反复参与**，问项目经理应该怎么办？

- A. 每周与团队成员开会，评估项目的优先级
- B. 每周与成员开会，评估发起人的预期
- C. 跟所有成员开一次会，比较项目优先级
- D. 每周与所有成员开一次会，评估他们对需求的期望



模拟三-第44题

错误多为C

44.项目团队发现了可采购的低成本软件开发工具，采用此工具可以大幅加快产品开发速度。开发经理经过检验，**确认此工具同样满足项目的业务需求**，作为项目经理，应该怎么做？

- A. 向产品负责人推荐此工具。
- B. 告知项目团队成员的主要职责是完成工作。
- C. 加入产品代办列表，以测试该工具的有效性。
- D. 在每日站会中讨论使用此工具的影响。



模拟三-第45题

错误多为D少量A

45.一位项目经理最近刚刚结束一个预测型项目，此项目经理受命参加一个新项目，**项目团队成员具有敏捷经验，但项目经理坚持要求在迭代前制定完整的项目章程**。请问，敏捷宣言价值观中的哪个可以化解这种误解？

- A. 个体和互动高于流程和工具
- B. 可工作的软件（产品）高于详尽的文档
- C. 客户协作高于合同谈判
- D. 响应变化高于遵循计划



模拟三-第46题

错误多为AC

46.高层要求项目经理**提供一个马上要完成的项目的价值文件**，项目经理应该怎么做？

- A. 评估干系人的需求
- B. 评估干系人的价值
- C. 评估项目预算价值
- D. 评估项目实际价值



模拟三-第51题

错误多为CD

51.一个来自不同国家和地区的团队被安排到集中办公，项目经理**担忧，团队缺乏动力，影响项目绩效**，项目经理应该怎么做？

- A. 组织项目启动研讨会
- B. 增加足够的应急预算
- C. 让发起人提供激励
- D. 组织项目风险研讨会



模拟三-第54题

错误多为C

54. 一名项目经理接手了一个岌岌可危的项目，并且了解到这个项目之前就很难推进。原因是，团队认为是前任项目经理的领导风格导致了项目的失控，现在团队也失去了动力，其他外部干系人也认为这个项目只是一项运营服务。项目经理要怎么做，才能使这个项目重振活力且成功交付？

- A. 建议项目发起人将你花费的成本视为沉没成本。
- B. 请求重新组建一个团队，并审查干系人参与计划。
- C. 建议团队开展领导力培训和团队建设。
- D. 设立新的项目愿景，并在团队内分配职权。



模拟三-第58题

错误多为C

58. 项目经理带领一个项目，该项目经理也是主题专家，项目经理经常在没有获得团队输入的时候做决策，团队士气低落，有成员想离开，请问项目经理怎么办？

- A. 进行冲突管理
- B. 允许成员参与决策
- C. 下次做决策时与团员深入协商讨论后，项目经理再做决策
- D. 团队建设



模拟三-第59题

错误多为AB

59.项目经理管理在管理一个多样化团队，来推进一个战略项目。他想关注不同成员间的情绪和互动，问应该具体关注成员哪些方面？

- A.自我意识 自我驱动，社交
- B.自我驱动 自我鼓励 社交
- C.自我意识 自我管理 社交
- D.自我鼓励 社交 动力

模拟三-第60题

错误多为C

60.一个经验丰富的 ERP 系统实施团队准备向客户交付系统，该系统需与客户现有的安全系统进行部署集成。客户要求必须完成此集成，而项目经理希望避免引入额外的外部依赖关系。问项目经理应该怎么做？

- A. 记录客户在安全系统集成方面的责任
- B. 按照客户要求集成，以确保客户满意
- C. 记录问题日志，并监督依赖关系
- D. 在首次迭代中纳入集成需求以降低风险





模拟三-第62题

错误多为B

62.团队执行敏捷，但是成员的敏捷经验不足，在每日站会上总是详细汇报自己的工作内容，项目经理如何处理？

- A. 继续听员工详细汇报工作内容
- B. 在计划会议中确定沟通汇报的内容
- C. 告知员工 pmo 没有要求进行详细工作日报
- D. 告诉员工每日站会应该聚焦于当前正在进行的工作内容



模拟三-第68题

错误多为D

68.在计划评审会上，scrum主管与一个团队成员对项目绩效有不同意见，问scrum主管应该怎么办？

- A. 结束会议，与发起人讨论收集更多绩效评价
- B. 会议结束后与hr和公司高层反馈。
- C. 与该团队人员继续讨论，并在会议纪要中记录。
- D. 以上均对



模拟三-第69题

错误多为BC

69.项目经理的首个敏捷项目财务周期开始，**下个月提交预算请求纳入财务计划**，范围已经大致划定，**缺少信息进行详细计算**，项目经理应该做什么？

- A.申请延期交付
- B.选用增量交付的方式进行
- C.使用建模工具（如蒙特卡洛模拟）预测预算
- D.基于现有信息进行高层级估算



模拟三-第71题

错误多为C

71.**某公司的指导委员会每周会收到预测型项目的报告**，但是，一个系统集成的项目正在采用敏捷方法。该敏捷项目的项目经理提供了一个燃尽图，用于与团队和产品负责人分享项目的进展。**指导委员向发起人抱怨说，他们没有收到这个系统集成项目的反馈**，也没有收到其项目状态的反馈。项目经理该怎么做？

- A.与发起人达成共识，在迭代之后准备一份执行报告
- B.回应产品负责人，敏捷项目估算是不断波动的
- C.与指导委员会分享待办事项列表优先级
- D.要求团队准备每周报告，并与管理人员分享



模拟三-第73题

错误多为C

73.一位项目团队成员在组织的某个关键项目上表现出较高的专业技能。但是，**该团队成员与团队其他成员的合作不佳**。这种行为可能会延迟项目的交付计划，因为其他团队成员的能力没有得到充分发挥。项目经理该怎么做？

- A.与该团队成员会面，讨论相关顾虑
- B.对其他团队成员进行技术开发培训
- C.运用领导力和软技能与团队成员一起解决问题
- D.让该团队成员对项目的整体成功负责



模拟三-第74题

错误多为A

74.一位项目经理被要求管理位于**不同城市的团队成员**，在制定资源管理计划时，项目经理应牢记哪些关键考虑因素？

- A.物理位置
- B.可用资产
- C.文化多样性
- D.项目生命周期



模拟三-第78题

错误多为D

78.项目经理正面临实施项目所在地的**社区产生的阻力**，项目经理首先应该做什么？

- A.安排与社区的会议来满足他们的需求
- B.建立对社区需求的认知，以实现项目目标
- C.让公共关系人员与社区会面，来确定社区的需求
- D.与有影响力的社区负责人会面来定位他们的需求，并获得他们的支持



模拟三-第82题

错误多为AD

82.某组织设立了一个大型转型项目，使其能够迈向国际水平，这个复杂的项目包括生产改进、工艺改进、和许多其他举措。尽管项目目标已正式传达给干系人，但项目经理注意到，**不同的干系人对项目的目的具有不同的看法**，可能会极大的影响项目绩效和成功。为了解决这个问题，项目经理应该采取哪三项措施？（选择三项）

- A.制定明确的项目目标文档
- B.再次查看并更新干系人参与计划
- C.根据组织的环境定制项目沟通
- D.安排小组协调会议来帮助项目
- E.再次查看并更新干系人登记册



模拟三-第87题

错误多为AE

87. 一个团队正在执行其第二次迭代评审会议。在演示期间，对未来的交付日期和工作范围有错误的预期。项目经理应采取哪两项措施？（选择两项）

- A. 要求项目团队安排额外的会议来展示项目管理计划。
- B. 与这些干系人会面，审查项目战略和目标。
- C. 帮助项目团队改进项目演示。
- D. 与干系人会面以明确团队权限。
- E. 项目团队成员与干系人会面。



模拟三-第88题

错误多为ABC

88. 在产品待办事项列表的优先级讨论期间，各方在制定策略来确定每个需求的相关性方面面临一些困难，在规划项目时，项目经理应考虑什么策略？

- A. 对项目团队列出的需求按照重要性进行优先级排序。
- B. 对产品负责人列出的需求按照可实现程度进行优先级排序。
- C. 对所有外部干系人和项目发起人列出的需求进行优先级排序。
- D. 对必要且具有充分条件说明的需求进行优先级排序。



模拟三-第89题

错误多为C

89.一位经验丰富的项目经理最近加入了一个处于危机中的项目。该项目由于**供应商延迟交付新服务器**而导致多次延迟，受到了影响。由于预算限制，该项目经理无法纳入新的供应商，且项目需要按照约定在最长90天内完成。项目经理该怎么做？

- A.联系该供应商，确定让项目重回正轨的计划。
- B.等到项目截止日期，才能动用应急资金。
- C.回顾从以前的项目中获得的经验教训并相应的采取措施。
- D.要求供应商按时提供服务，否则可能会受到处罚。



模拟三-第91题

错误多为AD

91.一位团队成员的绩效不佳，导致项目产生大量返工。**项目经理一直在向团队成员说明错误，但情况并没有改善**，团队的士气也有所下降。项目经理该做什么来应对这种情况？

- A.向该团队成员持续提供建设性反馈。
- B.将团队成员的行为上报给职能经理。
- C.要求服务对象向该团队成员提供反馈。
- D.提高其处理团队成员表现的软技能。



模拟三-第92题

错误多为B少量A

92.一位处于电信行业的项目经理负责在一个她们从未施工过的国家/地区开发实施5G蜂窝网络。该**项目经理对项目相关的规定感到担忧**。项目经理首先应该做什么？

- A.在项目规划阶段之间与当地政府会面，并协商该国家/地区特定的规定。
- B.要求团队收集具该国家/地区特定的规定并评估这些规定对项目的影响。
- C.审查项目章程，了解可能影响项目执行的国家/地区特定的规定指导。
- D.增加管理储备，以应对不遵守国家/地区特定的规定的风险。



模拟三-第95题

错误多为AB

95.一个生物技术项目处于交付阶段，这时项目**团队抱怨项目经理提供的项目文件过于复杂**，无法帮助他们发现和解决问题。项目经理该如何解决这个问题？

- A.实施自动化工具来帮助捕获问题。
- B.要求技术专家提供支持。
- C.与团队分享项目知识库。
- D.将该问题上报给项目发起人。



模拟三-第97题

错误多为B

97.某项目中的两位关键干系人由于其个人工作风格不同存在冲突。**冲突现已升级，项目经理要介入以促成令人满意的解决方案。**项目经理应该如何应对这种问题？

- A. 安排召开项目小组会议，同时邀请两位干系人参加。
- B. 将解决冲突的重点放在干系人身上而不是情况本身。
- C. 使用协作方法解决干系人的冲突。
- D. 制定基本规则，要求两位干系人遵守。

知识点记忆：

会议冲突：靠规则能解决，因为冲突是“没规矩的行为”；
工作风格冲突：规则解决不了，因为冲突是“偏好不同”；
会议冲突是“行为层面”的矛盾，基本规则能直接约束行为；工作风格冲突是“个性 / 习惯层面”的差异，规则管不了内在偏好。



模拟三-第98题

错误多为ACD

98.一位项目经理在风险管理流程中向团队解释如何处理积极和消极风险，并表示积极风险有助于项目的进程。项目经理应该做什么来**实现积极风险**？

- A. 确定该机会应通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该机会的详细信息。
- B. 通过增加发生的概率以确保特定风险一定会发生来获取与该风险相关的收益。
- C. 努力增加风险的概率或影响，并提高风险发生后的收益。
- D. 建立应急储备，以在机会发生时可以使用。



模拟三-第99题

错误多为BC

99.在一个敏捷项目中，一位业务代表对过去项目中识别的变更感到担忧。作为开发团队的一部分，项目经理应该提出什么建议来控制变更？

- A.在每次冲刺后执行待办事项列表的细化，以纳入变更并确定后续的优先级
- B.为所有已识别的变更创建评估流程，并将其记录为变更管理计划的一部分
- C.定义需求并达成一致，以避免将来发生变更
- D.利用已验证的技术获得明确的细节要求



模拟三-第100题

错误多为B

100.某项目团队审查了需求并识别出一些顾虑。项目发起人询问团队他们将如何处理每项顾虑。项目经理接下来该做什么？

- A.与项目团队合作，评估每项风险的严重性
- B.为每项风险制定缓解策略，并更新风险登记册
- C.与干系人合作制定沟通管理计划
- D.与团队成员商量，生成蒙特卡洛模拟图



模拟三-第101题

错误多为B

101.一位项目经理在项目中途加入，发现团队**在过去的几个冲刺中都没有邀请项目干系人参加冲刺结尾的评审会议。**项目干系人已开始提供反馈，他们不相信该项目会交付已识别的收益。项目经理接下来该做什么？

- A.评估可以展现价值的交付方案选项
- B.核实是否已建立了可以跟踪价值的衡量体系
- C.调研外部业务环境的变化情况
- D.建议范围/待办事项列表变更的选项



模拟三-第103题

错误多为ABD

103.在冲刺评审中，一位没有积极参与项目但却是**项目成果受益者的高级经理**询问他们部门是否可以被纳入的**第一批试点。**项目负责人刚刚与产品负责人最终确定了列表，且知道由于组织制约因素无法修改该列表。项目负责人该做什么？

- A.告知高级经理，业务部门名单以最终确定，无法修改
- B.告知高级经理，其要求必须得到项目管理办公室的批准
- C.让高级经理与产品负责人讨论该问题，并提出变更申请
- D.让高级经理下一次冲刺规划，与团队讨论问题



模拟三-第104题

错误多为D

104.一个项目团队在处理组织的数字化转型项目期间进行组建，团队成员属于一家大型组织、分布在不同地理位置的不同部门。项目经理首先要做什么来组建一支高绩效团队？

- A.安排与项目团队召开一次会议，设定项目期望
- B.安排一次团队建设活动，促进项目团队开展互动并提高绩效
- C.保持项目目标和优先级一致，为项目团队制定共同目标
- D.为项目团队实施电子协作平台，促进彼此之间的沟通



模拟三-第106题

错误多为C

106.一位项目经理收到供应商的通知，内容是一个项目所需的物资将延迟6周交付，项目经理首先应该做什么？

- A.寻找其他供应商，准时交付所需物资
- B.将其记录为风险，并定义风险应对计划
- C.将其视为一个问题，并启动风险应对计划
- D.安排产品负责人与供应商一同解决这个问题



模拟三-第107题

错误多为AC

107.项目团队报告了一项缺陷，项目负责人**将缺陷原因确定为流程问题**，并将其添加到问题日志中。负责人应该在什么时候与其团队讨论这个问题？

- A.在每日例会期间
- B.在下一次冲刺评审期间
- C.下一次专门的研讨会期间
- D.在冲刺回顾会议期间



模拟三-第108题

错误多为B

108.一位项目经理被指派负责一个项目。其目标应与两位具有高度影响力的干系人就业务目标达成共识，这两位干系人在待办事项列表的细化期间对待办事项列表的优先级**存在分歧。这一冲突使得项目团队的冲刺规划变得十分具有挑战性。**在这种情况下，项目经理该做什么？

- A.项目团队会议之前安排时间与两位干系人一起讨论，并就项目目标达成共识。
- B.让两位干系人会面，讨论各自的需求，就项目的商业价值达成共识。并向项目团队提供反馈。
- C.将冲突识别为风险，并与项目团队一起更新根据风险调整后的待办事项列表。
- D.建议项目团队处理不受分歧影响的事项。



模拟三-第109题

错误多为AC

109.在一次冲刺回顾中，一名团队成员表示他们不知道整体项目目标，他们对项目没有参与感，同时感到自己可能会无法按时交付最终产品的关键组件。项目经理该怎么做？

- A.向团队成员展示项目时间线和状态报告，让他们了解目标日期。
- B.安排产品发布开工会议来同步情况，对高级别计划进行概述。
- C.与团队分享角色和职责，说明他们何时能够完成任务。
- D.让团队成员参加会议，鼓励他们了解未决问题。



模拟三-第113题

错误多为CD

113.一个由专业工程师组成的团队完成部分任务的时间晚于计划的时间，而且质量低于预期。这种情况限制了团队为业务创造的价值。项目经理下来该做什么？

- A.在进入下一次迭代之前，确认已应用正确的质量测试。
- B.在考虑质量问题的同时执行下一次迭代规划。
- C.质量审查已获得干系人的批准和反馈。
- D.引入技术债务代办事项列表中发现的所有质量问题。



模拟三-第117题

错误多为CD

117.一个发起人告知项目经理说**客户提了一个新的需求**，项目处于执行阶段，该需求不属于原本需求范围内，项目经理觉得需求可以做，但是需要时间。项目经理应该做什么？

- A. 让某个团对成员对该需求进行监督并控制实施
- B. 记录需求并执行控制变更流程
- C. 和发起人讨论对该需求的评估及影响
- D. 指出范围的变大，并告知客户需要对成本，时间，进度进行重新评估



模拟三-第119题

错误多为AD

119.敏捷项目中，**项目经理想了解初始范围变更产生的工作量**应当做以下哪个事情？

- A. 计算速度曲线与待办事项列表中已完成事项的差异
- B. 查看已完成的待办事项的工作量
- C. 燃起图的用户故事
- D. 查看待办事项列表的未完成事项与工作量



模拟三-第120题

错误多为AC

120. 一个敏捷项目对模块进行开发，该项目与其他团队有依赖关系，项目干系人对产品最终效果不清楚，项目经理应该采取什么措施？

- A. 与其他团队一起协作创建开发原型
- B. 在每次冲刺结束时，与其他团队和干系人进行产品演示
- C. 开发最小可行产品
- D. 与其他团队协作，尽快交付项目成果



模拟三-第126题

错误多为BD

126. 一家公司发起了一项旨在提高效率的项目，在每月一次的干系人会议上，一名运营经理指出，和项目后续支持相关的需求所做的决策他不知情，请问接下来项目经理应该怎么办？

- A. 征求所有干系人的意见
- B. 更新沟通管理计划
- C. 更新干系人参与计划
- D. 组织一次团队会议，与团队讨论此问题



模拟三-第128题

错误多为D

128.一位服务对象发现有缺陷的产品特性。要弥补缺陷，**需要资金修复产品**。项目经理应该怎么做？

A.提交变更申请至变更委员会（CCB），索要额外资金修复产品。

B.与团队协作，改进质量控制流程

C.联系发起人申请修复资金

D.与服务对象一起重新审查产品缺陷



模拟三-第130题

错误多为C

130.一家公司赢得了某政府的建议邀请书RFP,项目合同在6个月后签署，**当时的通货膨胀为30%**，项目经理应该做什么管理预算？

A. 取消项目，因为预算不足与满足项目需求

B. 更改项目要求，并收取潜在的罚款

C. 与项目发起人一起审查成本节约的可能性和潜在节约的新方法

D. 与服务需求商一起审查成本节约的可能性，达成双方损失的平衡



模拟三-第132题

错误多为BD

132.某大学要做一个项目，这个项目可以满足数字化方面数据处理准确性、系统兼容性等要求，对于人为错误修改方面，也可以人为修改简易文档录入错误、配置参数设置不当等。问项目经理应该如何**保证项目满足价值**？

- A.分析市场环境
- B.分析业务需求
- C.分析项目目标、预计成功和实施计划
- D.分析项目预期收益和成本预算



模拟三-第134题

错误多为A

134.有一个大项目，项目里面有一些子集，子集都是大项目级的一部分，**有一个供应商项目要延迟两个月才能满足质量交付，另外一个供应商项目依赖于这个项目的交付成果**，这个延迟不会对项目造成任何影响。问项目经理应该**如何去做**？

- A.让供方按照项目当前的这个进度去制定交付计划，并且要满足项目的质量要求。
- B.缩小交付范围，并且做变更延迟。
- C.更新变化和变更，并且把这个变更告知到相关的干系人。
- D.让两个供货方他们见面，自己去沟通，然后制定一个新的这个交付计划。



模拟三-第135题

错误多为B

135.一个自组织团队，采用轮流主持人责任制，其中一位团队成员负责时，忽略了一位重要干系人发送的关于变更的邮件。请问谁应该对这个事件负责任？

- A.工作流程中没有涵盖这个范围，因此干系人人为此负责。
- B.担任团队轮流主持人，因为错过重要邮件，为此负责。
- C.项目采用去中心化风格，所以应该根据去中心化风格负责。
- D.批准去中心化风格的批准人，为此负责。



模拟三-第136题

错误多为BD

136.PMO聘请了你作为项目经理管理敏捷团队，团队已经想出一个新产品的创意，项目发起人愿意提供资金，并定义了产品愿景和路线图，作为项目经理，你下一步应该怎么做？

- A.提供培训来确保员工更加专业化
- B.确保提供必要的技能和知识满足愿景
- C.寻求愿意支持这一事业的高层高管
- D.在工作区中显示产品路线图，并通过虚拟方式分发给项目干系人



模拟三-第138题

错误多为CD

138. 职能经理发现团队成员由于身体原因非常疲惫和劳累，经过**职能经理和执行发起人协调沟通，确认可以在每一周的其中半天休息**，作为项目经理应该怎么做？

- A. 支持职能经理和发起人协调的结果，认可这一决定并积极配合执行
- B. 认为这样是违反规定的，指出这种休息安排不符合项目的既定规则和流程
- C. 寻找替代方案，考虑是否有其他方式可以让团队成员得到休息，同时又能尽量减少对项目进度和质量的影响
- D. 评估项目进度，确认项目是否延期，以便采取相应措施



模拟三-第139题

错误多为A

139. 某组织正在进行中央仓库系统向分布式系统的迁移，但**这会对正在进行的业务有干扰影响**，问项目经理应该考虑什么因素，**降低对现有业务的影响**？

- A. 评估商业论证的影响
- B. 评估组织文化的影响
- C. 评估项目基准的影响
- D. 评估团队章程的影响



模拟三-第142题

错误多为A

142.已根据批准的范围启动一个项目。在实施项目设计过程中,一位团队成员表示该产品在特定情景下不能满足需求。**解决这个问题将增加范围和成本,且项目将错过最后期限。**项目经理应该怎么做?

- A.进行风险分析并向项目发起人更新进展
- B.执行实施整体变更控制过程**
- C.通知客户并协商接受风险
- D.纠正问题,以让客户满意



模拟三-第143题

错误多为B

143.你是某敏捷项目的项目经理,项目需交付多组软件功能以满足不同干系人需求。近期部分干系人反馈:**不清楚自己的需求何时能交付,并表现出对进度的担忧。**以下哪项是最佳应对措施?

- A.邀请干系人参加每日站会,同步当日进展
- B.邀请干系人参与冲刺规划会议,明确迭代交付内容
- C.编制详细的项目管理计划与责任分配矩阵
- D.维护待办事项列表优先级,并定期向干系人共享路线图**



模拟三-第145题

错误多为AB

145.某项目需在含有珍稀植被的生态敏感区域实施。**为确保项目合规且顺利推进**，项目经理应首先采取哪项措施？

- A. 执行内部质量审计计划
- B. 执行外部质量审计计划
- C. 执行未批准的质量管理计划
- D. 执行已批准的质量管理计划



模拟三-第154题

错误多为AB

154.在冲刺审查期间，一个先前休假，**未参与产品待办事项细化会议的干系人**，**提出了一项重大范围变更需求**，项目负责人首先应该做什么？

- A.在登记册中更新这个问题，并制定变更申请。
- B.跟开发人员讨论变更，并评估人力需求。
- C.拒绝需求，告知该干系人范围已批准。
- D.让产品负责人添加到产品待办事项列表，并确定优先级。



模拟三-第155题

错误多为A

155. 一名项目团队中的成员表现比较差，团队成员自己很努力。近日，从其他团队成员口中听到了关于这位团队成员的赞扬，项目经理应该怎么做？

- A. 激发该名团队成员的激情
- B. 给该名团队成员发放奖励
- C. 在下次团队会议中赞扬该团队成员
- D. 给这名团队成员安排更为重要的工作



模拟三-第157题

错误多为AC

157. 一个项目招募了高素质员工，并采购了大量设备，以改善一个正在进行中项目的效率和效果，项目经理首先需做什么？

- A. 计算投资回报率
- B. 用风险临界值进行比较
- C. 将实际成本与计划成本进行比较
- D. 计算成本绩效指数



模拟三-第161题

错误多为B

161. **两名团队成员因任务分配冲突**从而影响项目进度，项目经理应该怎么做？

- A. 重新分配任务并明确责任
- B. 组织团队回顾会议讨论协作规则
- C. 上报职能经理处理人员问题
- D. 调整项目计划延长截止时间



模拟三-第162题

错误多为C

162. 一个项目采用混合模式（瀑布+敏捷），**项目经理发现需求频繁变更**导致WBS失效。此时首先更新的是什么？

- A. 详细的项目章程
- B. 产品待办事项列表
- C. 变更控制流程文档
- D. 风险管理计划



模拟三-第164题

错误多为A

164.公司某位高管抱怨敏捷项目的燃尽图难以理解，要求改用甘特图跟踪进度。该敏捷项目经理该怎么做？

- A.同时提供燃尽图和甘特图以满足需求
- B.邀请高管参加冲刺评审会直接体验可交付成果
- C.改用传统项目管理方法以符合高管偏好
- D.解释燃尽图价值并拒绝变更



模拟三-第168题

错误多为D

168.冲刺开始前，产品负责人希望所有的待办事项都分配给团队成员，项目经理应该怎么做？

- A.给效率高的成员分配较多的任务，给效率低的成员分配比较少的任务
- B.让团队成员自己认领任务
- C.项目经理指定给团队成员相关的任务
- D.每位成员提出最想认领的任务，并以此为参考进行任务分配



模拟三-第169题

错误多为CD

169.在向服务对象交付一项关键成果时，项目经理意识到**团队未对一项已告知的合规性问题进行处理**，项目经理应该如何应对此情况？

- A 与关键干系人会面，对此情况讨论解决方案
- B 在向服务对象交付时，解释在交付之前已经制定了解决方案
- C 在向服务对象交付前，与产品负责人就合规问题进行讨论并确认解决
- D 进行全面风险分析，并确认合规性对项目的影响并制定应急计划



模拟三-第171题

错误多为C少量A

171.组织会定期安排各项目团队进行参观培训，在一次新型技术参观活动中，**敏捷团队的一名成员表现出浓厚的兴趣，在之后的工作中，花费更多的时间研究新技术而不是开发可交付成果增量**，导致绩效偏低。作为管理人员应该做什么？

- A. 认同该团队成员的探索精神，在每次迭代中安排固定时长用于研究新技术
- B. 与团队共同讨论此问题，讨论如何作为一个团队进行研究
- C. 要求团队成员优先完成工作事项，可以在工作外的时间单独研究
- D. 移交团队成员部分工作量给其他成员，让其继续研究新技术



模拟三-第172题

错误多为C

172. 一个富有实力和动力十足的项目团队负责人尝试分配任务，以提高团队的优势，并且提供指导和培训给团队成员，问敏捷项目经理应该怎么办？

A 建立共同责任制

B 委派职责

C 加强授权

D 定义决策



模拟三-第173题

错误多为ACD

173. 一项针对新的可再生资源项目的预可行性研究即将批准，但因为项目进度原因，原计划被打乱。在预可行性研究等待批准的同时，与可行性研究相关的工作要同步开展，请问项目经理怎么办？

A. 确保预可行性研究能够在可行性研究活动之前获得批准。

B. 获得批准，以便在预可行性研究批准的同时，可行性研究活动同步开展。

C. 将可行性研究活动纳入预可行性研究，并请求范围和预算的变更。

D. 在等待最终批准的同时，同步进行预可行性研究和可行性研究。



模拟三-第174题

错误多为AD

174.团队正在进行十次迭代的第九次，在一次每日站会上提出问题，说项目不能按时完成，还需要额外的两次迭代，但是项目发起人还认为项目可以按时完成，可是真实情况并不是如此，项目经理该怎么做？

- A.更新问题日志，并向项目发起人反馈
- B.推动团队与项目发起人开会讨论
- C.提高团队效率
- D.让团队讨论对策



模拟三-第179题

错误多为BD

179.一位项目经理正在领导一个复杂项目，项目干系人来自不同国家/地区、文化、语言的个人，请问项目经理可以采取什么措施来管理这个多样化群体？

- A.指定一种语言为主要沟通语言，并指定一个时区作为官方时区
- B.根据团队成员的文化、语言，组织并分配项目可交付成果
- C.执行分析，了解不同群体的沟通需求和偏好
- D.要求项目管理办公室(PMO)指派一位文化经理监督多样化群体之间的关系



模拟三-第180题

错误多为C

180.一家公司正从传统预测式管理向敏捷管理转型，项目经理在项目中同时运用两种管理方式，且担任服务型领导角色。现出现一个可交付成果延迟的情况，此时项目经理应采取以下哪种措施？

- A. 找外部团队来做敏捷部分的工作。
- B. 向相关人员介绍敏捷管理的好处。
- C. 调整进度计划，解决可交付成果延迟的问题。
- D. 协助产品负责人重新评估可交付成果。



P A S S

现代卓越
专注项目管理培训26年



祝大家
ONE PASS!
ALL PASS!
